


TEKST: MR. MIRJAM BOS

BEELD: LUUK POORTHUIS

Wat als werkzaamheden meer kosten dan geraamd?

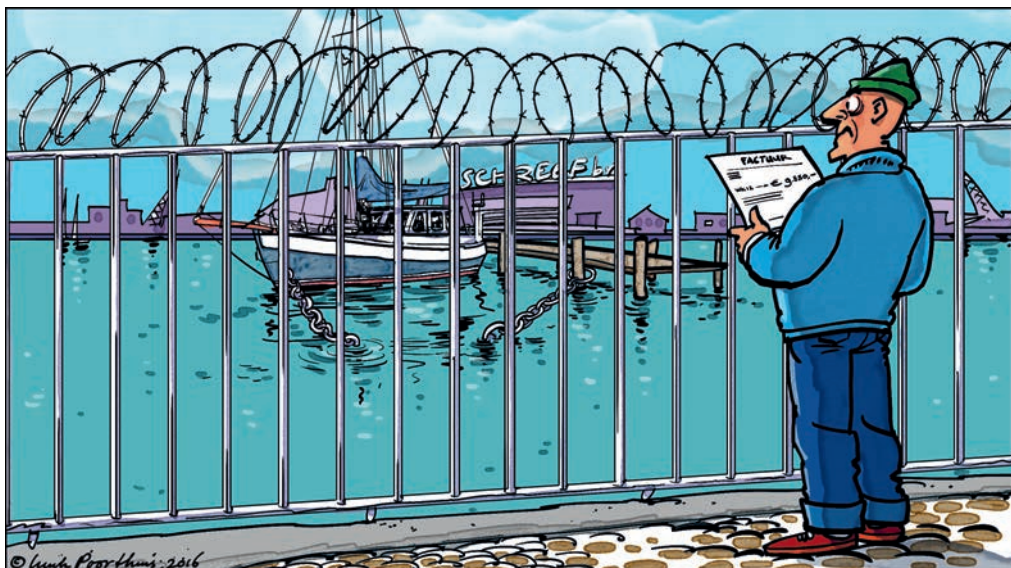

Meneer Schipper heeft op een veiling zijn droomboot kunnen kopen. Om er in de nabijgelegen vakantie mee naar Engeland te varen, zoals hij en mevrouw Schipper al heel lang willen, zal het eerst zeewaardig en betrouwbaar moeten zijn. Ze nemen een bedrijf in de arm om het schip te laten renoveren, Schreef BV. Deze stelt voor om de klus op regiebasis uit te voeren. Gezien de haast die Schipper heeft, gaat met het opstellen van een offerte teveel tijd verloren, aldus Schreef BV.

Schipper is wat huiverig hiervoor en waarschuwt dat ze 'slechts' een potje met 13.000 euro beschikbaar hebben. Schreef BV wuift de angst van de heer Schipper weg. Laat dit nou precies het bedrag zijn dat hij heeft geraamd voor dit project. Schreef belooft bovendien wekelijks een factuur te sturen van zijn vorderingen en gaat aan de slag.

Vier weken later valt de eerste factuur op de mat bij Schipper. Deze bedraagt een kleine

10.000 euro. Schipper schrijft geschrokken een e-mail aan Schreef BV. Hij wijst het bedrijf op de gemaakte afspraak over de aangegeven richtprijs. Een week later factureert Schreef BV nog eens ruim 10.000 euro met een uitgebreide toelichting waarom het project zoveel duurder is uitgevallen.

Blijkbaar waren er wat tegenvallers. Zo bleek het dek op veel plaatsen rot. Schipper weigert de gevorderde 20.000 euro te betalen. Schreef BV weigert op zijn beurt het schip af te geven, waarop Schipper Schreef BV voor de rechter daagt. Deze oordeelt dat Schreef BV Schipper niet genoeg op de hoogte heeft gehouden van zijn werkzaamheden op het schip en de gevolgen voor de kosten. Schipper heeft hierdoor niet de kans gehad de opdracht aan te passen of voor (goedkopere) alternatieven te kiezen. Schipper hoeft van de rechter niet meer dan 14.300 euro te betalen aan Schreef BV, die het schip vervolgens ook vrij moet geven. •

Overschrijding

Bij het werken op regiebasis is volgens onze wet een overschrijding van meer dan 10 procent van een afgegeven richtprijs niet mogelijk, tenzij de aannemer van het werk op tijd voor een verdere overschrijding heeft gewaarschuwd. Zo tijdig, dat de opdrachtgever de kans krijgt het werk te beperken of te vereen-

voudigen. Dat een klant (regelmatig) een factuur krijgt en zelf zou kunnen inschatten dat de richtprijs met meer dan 10 procent zou worden overschreden, is meestal, en zo ook in dit geval, niet voldoende argument om over de 10 procent overschrijding heen te mogen gaan.



Metaalunie Rechtsbijstand behandelt in deze rubriek interessante juridische kwesties op een lichte manier. De namen en plaatsen zijn verzonnen, gelijkenissen met personen of bedrijven zijn louter toevallig.

Juridische professionals tegen gunstige tarieven

Metaalunie Rechtsbijstand is een zelfstandige dienst en weet als geen ander waar u als ondernemer in de metaalsector behoefte aan heeft. Zij biedt u een zorgvuldig geselecteerd netwerk van deskundige advocaten en een speciaal voor leden ontwikkelde Mevas rechtsbijstandverzekering.

U kunt bij Metaalunie Rechtsbijstand terecht voor:

- Advocaten
- Octrooigemachtigden
- Juridische bedrijfsanalyse
- Incasso
- Maatcontracten
- Algemene voorwaarden

Meer weten? 030 - 605 33 44 of
www.metaalunierechtsbijstand.nl
